


K 31.10.2020 bolo zainjektovaných 53 vrtov (z toho v októbri ich bolo realizovaných 11) z 53 plánovaných vrtov. Ostáva doinjektovať SK-10.

Na obrázku uvádzame prehľad jednotlivých preinjektovaných oblastí a ich celkové spotreby injekčných zmesí.

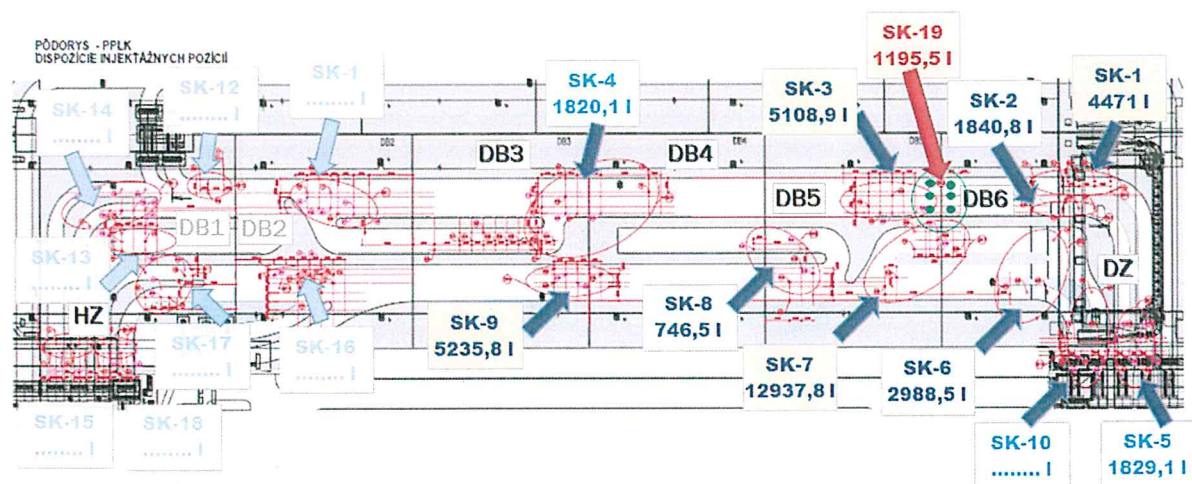

Vzhľadom na to, že injekčné práce v blokoch 1 a 2 sú podmienené účinnosťou utesnenia vtokového objektu, v tejto časti PLK sa ešte injektáž nerealizovala.

Po vyhodnotení doterajšieho postupu injektáží a spotrieb injekčnej zmesi v jednotlivých vrtoch boli projektantom prehodnotené počty vrtov a na jeho pokyn bolo v mieste najväčších nerovnomerných deformácií PLK doplnených ďalších 6 vrtov pred a za dilatačnou škárou medzi DB 5 a DB6 (SK-19). Na základe ich spotrieb bude pristúpené k prehodnoteniu doplnenia vrtov v okolí ďalších dilatačných škár.
